

Gesuch Nr...../20 .....

**Gesuch für Grab- und Anpassungsarbeiten bei kommunalen Strassen und Wegen**  
(Bewilligungen für Aufgrabungen im Staatsstrassengebiet sind direkt beim Kanton einzuholen)

**Grundlagen:** Kantonales Planungs- und Baugesetz, §231  
Allgemeine Baubedingungen der Gemeinde Erlenbach  
Verordnung über die Inanspruchnahme des öffentlichen Grundes (VöG)

**Gesuch für Grabarbeiten**

**Gesuch für Anpassungsarbeiten**

Adresse Arbeiten: .....

Hausnummer: .....

Grabarbeiten in:

Fahrbahn ..... m<sup>2</sup>  Trottoir ..... m<sup>2</sup>  Fussweg ..... m<sup>2</sup>

Gesuchsteller/in: .....

.....

.....

Zweck der Grab-

Anpassungsarbeiten: .....

Unternehmung: .....

.....

Baubeginn Grabarb.: ..... Bauzeit: .....

Rechnungsadresse: .....

.....

.....

**Kontaktperson:**

Name: .....

Tel.: .....

E-Mail: .....

**Ort:** ..... **Datum:** ..... **Unterschrift Gesuchsteller/in:** .....

Dem Gesuch sind je nach Inanspruchnahme des öffentlichen Grundes folgende Unterlagen beizulegen:

- Bei kleinen Flächen (Grabarbeiten):** Situation 1:500 mit den wiederherzustellenden Flächen
- Bei umfangreichen Bauten:** Resultat der schriftlichen Abklärungen über geplante Bauvorhaben im Bereich der beanspruchten Fläche im Gemeingebrauch der folgenden Unternehmungen: Swisscom AG, Werke am Zürichsee AG (Wasser, Elektrizität), Energie360° AG und Cablecom AG. Projektplan 1:500 oder grösser.
- Bei Anpassungen von Gemeindestrassen an private Grundstücke:** Detailprojekt mit Kotierung und Angabe der vorgesehenen Abschlüsse (Material und Typ).

**Gesuch um Bewilligung**  
Durch Gesuchsteller/in auszufüllen

# Bewilligung

Durch die Bauabteilung auszufüllen

1.  Dem/Der Gesuchsteller/in wird die Aufbruchbewilligung nicht erteilt. Begründung: .....
2.  Dem/Der Gesuchsteller/in wird die Bewilligung gemäss vorstehendem Gesuch sowie unter folgenden Nebenbestimmungen erteilt:
  - 2.1 Als integrierende Bestandteile gelten, soweit sie dem Bundesrecht nicht widersprechen
    - die Allgemeinen Baubedingungen der Gemeinde Erlenbach
    - die Verordnung über die Inanspruchnahme des öffentlichen Grundes (VöG)
    - die anschliessend aufgeführten Auflagen und Bedingungen
    - die eingereichten Pläne
    - die Signalisationsverordnung vom 5. September 1979 (SSV; SR 741.21)
    - die SIA- und VSS-Normen
  - 2.2 Die Kosten der erstmaligen Instandsetzung sowie die Behebung von Mängeln innerhalb der 5-jährigen Garantiezeit gehen zu Lasten des/der Gesuchstellers/in. Die Ermittlung der Kosten richtet sich nach der Gebührenverordnung über das Bauwesen, Art. 36 (Belagsaufbrüche im öffentlichen Grund). Mängel werden dem/der Gesuchsteller/in vor der Instandstellung schriftlich gemeldet
  - 2.3 Gegen diese Bewilligung kann innert 30 Tagen, vom Empfang an gerechnet, beim Gemeinderat Erlenbach schriftlich und begründet Einsprache erhoben werden.

## Auflagen und Bedingungen (durch die Bauabteilung auszufüllen)

### 3. Allgemeines

In Erlenbach können bei folgenden Werken Leitungen und Detailinformationen erhoben werden:

Elektrizität:	043 222 32 50	Vermessung:	044 928 30 60
Gas / Wasser:	043 222 32 60	Energie360° AG	043 317 21 77
Kanalisation:	044 914 22 44	Abteilung Sicherheit:	044 913 88 18
Cablecom:	0800 66 88 66		

- Der/Die Gesuchsteller/in (oder die von ihm/ihr beauftragte Unternehmung) nimmt ..... Tage vor der Bauausführung mit dem Kontrollorgan der Gemeinde (Heinz Bergmann GmbH, Tel. 044 796 10 90) betreffend Koordination Kontakt auf.
- Findet eine Koordinationssitzung statt, wird Punkt 5 vor Ort besprochen und festgelegt.
- Der Belag ist in jedem Fall beidseitig min. 20 cm nachzuschneiden (VSS SN 640 731b). Die einzubauende Belagsbreite muss mindestens 80 cm breit sein. Bleibt anschliessend weniger als 50 cm Belag bis zum Belagsabschluss übrig, muss auch dieser entfernt werden (VSS SN 640 535c).
- ME- Messung
- Unterquerte Randabschlüsse sind neu zu versetzen (kein Tunnelbau)
- Die Gräben sind ausserhalb der Arbeitszeit mit Stahlplatten abzudecken
- Die Stahlplatten sind in den Belag abzusenken damit der Winterdienst gewährleistet ist (keine Anrampung Nov. - März)
- Vor dem Einbau der Tragschicht ist die Bauabteilung zur provisorischen Abnahme der Strassenplanie aufzubieten.
- Nach Einbringen des Deckbelags (Beginn der Garantiefrist) ist das Kontrollorgan der Gemeinde durch den/die Gesuchsteller/in zur definitiven Abnahme aufzubieten.
- Während der gesamten Bauzeit sind bei der Baustelle Infotafeln (Inhalt: Bauherrschaft, Bauvorhaben, Dauer der Baustelle, Kontaktperson mit Tel.-Nr.) zu stellen.

**Bemerkungen:** .....

.....

.....

### 4. Verkehr


Absperrung und Signalisation der Baustelle sind vorgängig mit der Abteilung Sicherheit zu besprechen. Der Strassenverkehr darf durch die Bauarbeiten weder wesentlich behindert noch unterbrochen werden. Der/Die Gesuchsteller/in hat alle Massnahmen, die von der Abteilung Sicherheit zur Aufrechterhaltung des Verkehrs vorgeschrieben werden, auf seine/ihre Kosten vorzunehmen.



# Grabenprofil 1:20

Die einzubauende Belagsbreite muss mindestens 80 cm betragen.  
Die Belagsränder müssen mit einer bituminösen Anstrichmasse angestrichen werden.

**Belagsinstandsetzung gemäss VSS-Normen**  
\* Verbleibt ein Belagsstreifen von weniger als 50 cm, muss die Wiederinstandsetzung bis zum Strassenrand erfolgen

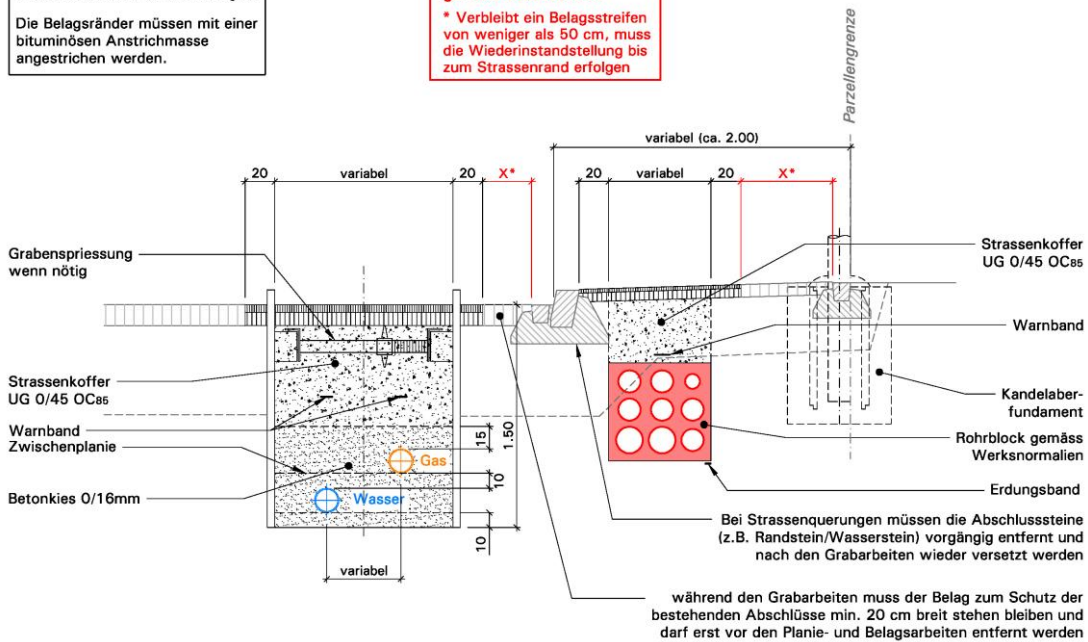

## Verteiler:

- Gesuchsteller/in
- Bauabteilung, Leiter Tiefbau und Umwelt
- Strassenmeister
- Abteilung Sicherheit
- Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland (VZO)
- Heinz Bergmann GmbH, Uerikon
- J. Grimm AG, Oetwil am See

## Gemeinde Erlenbach

Bauvorstand

Leiter Tiefbau und Umwelt

Martin Dippon

Roman Mathieu

Erlenbach, .....
